EXTENSION ET RÉHABILITATION DU SECTEUR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PLANNING DÉTAILLÉ DES TRAVAUX TCE UBM - SRIA - FILTRÉ SUR LES TRAVAUX AVEC NUISANCES

EIFFAGE CONSTRUCTION

	Responsable	Bâtiment	Phase travaux	Tâche	Durée	Début	Fin	%
18				**2. UBM PHASE 1 - TRAVAUX CARRÉ**	512 j	Jeu 24/09/20	Ven 09/09/22	0%
117				2.2 PHASE 1.2 : CARRE PARTIE 2 : RESTRUCTURATION DES BATIMENTS L ET M	225 j	Lun 02/11/20	Ven 10/09/21	0%
120				*2.2.1 CURAGE / DESAMIANTAGE DES CIRCULATIONS DES BATIMENTS L ET M*	*205 j*	*Lun 16/11/20*	*Ven 27/08/21*	0%
121				**2.2.1.2 CURAGE / DESAMIANTAGE CIRCULATION M R+1 / L R+1**	**25 j**	**Lun 26/07/21**	**Ven 27/08/21**	0%
122	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	L&M R+1	PHASE 1,2	Curage / Mise en place des confinements / Désamiantage / Retrait du mastic amianté / Mesures d'empoussièrement et dépose des confinements	15 j	Lun 26/07/21	Ven 13/08/21	0%
124				**2.2.1.3 CURAGE / DESAMIANTAGE CIRCULATION L RDC**	**40 j**	**Lun 16/11/20**	**Ven 08/01/21**	0%
125	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	L RDC	PHASE 1,2	Curage / Mise en place des confinements / Désamiantage / Retrait du mastic amianté / Mesures d'empoussièrement et dépose des confinements	40 j	Lun 16/11/20	Ven 08/01/21	0%
159				2.3 PHASE 1.3 : CARRE PARTIE 3 : TRAVAUX COMMUNS CARRE - PARTIE 1 (ÉTÉ 2021)	115 j	Lun 05/04/21	Ven 10/09/21	0%
160				*2.3.1 RESTRUCTURATION DE L'AMPHI CIROT RENOUARD - PARTIE 1 (ÉTÉ 2021)*	*50 j*	*Lun 28/06/21*	*Ven 03/09/21*	0%
162				**2.3.1.1 MENUISERIES EXTERIEURES**	**35 j**	**Lun 05/07/21**	**Ven 20/08/21**	0%
163	01-DESAMIANTAGE	CIROT RENOUARD	PHASE 1,3	Dépose des menuiseries extérieures et retrait du mastic amianté	15 j	Lun 05/07/21	Ven 23/07/21	0%
268				**3. UBM PHASE 2- TRAVAUX PEIGNE**	651 j	Ven 25/09/20	Ven 24/03/23	0%
355				3.2 PHASE 2.2 : PEIGNE PARTIE 2 : CRÉATION BU STC / L	395 j	Lun 04/01/21	Ven 08/07/22	0%
364				*3.2.2 CURAGE / DESAMIANTAGE DU RDC DES BATIMENTS A / B / C / D*	*50 j*	*Lun 02/08/21*	*Ven 08/10/21*	0%
365	01-DESAMIANTAGE	A / B / C / D (RDC)	PHASE 2,2	Consignation des réseaux / Curage / Mise en place des confinements / Désamiantage / Retrait du mastic amianté / Mesures d'empoussièrement et dépose des confinements des bâtiments A et B (RDC)	40 j	Lun 02/08/21	Ven 24/09/21	0%
366	01-DESAMIANTAGE	A / B / C / D (RDC)	PHASE 2,2	Consignation des réseaux / Curage / Mise en place des confinements / Désamiantage / Retrait du mastic amianté / Mesures d'empoussièrement et dépose des confinements des bâtiments C et D (RDC)	40 j	Lun 16/08/21	Ven 08/10/21	0%
367				*3.2.3 RESTRUCTURATION LOURDE DU RDC DES BATIMENTS A / B / C / D*	*360 j*	*Lun 04/01/21*	*Ven 20/05/22*	0%
368				**3.2.3.1 GROS OEUVRE / CLOS COUVERT**	**35 j**	**Lun 06/09/21**	**Ven 22/10/21**	0%
370	03- GROS OEUVRE	A / B / C / D (RDC)	PHASE 2,2	Ouverture des façades des bâtiments A / B / C / D (RDC) pour jonction avec le bâtiment A1 + Etanchéité sur parois	20 j	Lun 06/09/21	Ven 01/10/21	0%
371	03- GROS OEUVRE	A / B / C / D (RDC)	PHASE 2,2	Création trémie, carottages, percements A / B / C / D (RDC)	25 j	Lun 20/09/21	Ven 22/10/21	0%
372				**3.2.3.2 CONSTRUCTION EXTENSION EN FACADE DU BATIMENT B**	**195 j**	**Lun 09/08/21**	**Ven 06/05/22**	0%
373	02-DECONSTRUCTION	B	PHASE 2,2	Dépose élément préfabriqué en façade / création ouverture / Reprise soubassement / Fondations / Terrassements	30 j	Lun 09/08/21	Ven 17/09/21	0%
380	18- VRD	B	PHASE 2,2	Réseaux EP extension / Création voirie pompiers / Rampe P	35 j	Lun 15/11/21	Ven 31/12/21	0%
381				**3.2.3.3 CONSTRUCTION EXTENSION DANS LE PATIO DU BATIMENT D**	**360 j**	**Lun 04/01/21**	**Ven 20/05/22**	0%
390	18- VRD	D	PHASE 2,2	Réseaux EP extension / Création voirie pompiers / Rampe P	40 j	Lun 19/07/21	Ven 10/09/21	0%
421				3.3 PHASE 2.3 : PEIGNE PARTIE 3 : TRAVAUX COMMUNS PEIGNE	651 j	Ven 25/09/20	Ven 24/03/23	0%
422				*3.3.1 REFECTION DES CIRCULATIONS A & B R+1*	*296 j*	*Ven 25/09/20*	*Ven 12/11/21*	0%
430				**3.3.1.1 CIRCULATION DU BATIMENT A R+1**	**46 j**	**Lun 09/08/21**	**Lun 11/10/21**	0%
431				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 09/08/21**	**Ven 24/09/21**	0%
432	01-DESAMIANTAGE	A R+1	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	22 j	Lun 09/08/21	Mar 07/09/21	0%
434	03- GROS OEUVRE	A R+1	PHASE 2,3	Création d'ouverture en façade pour création liaison vers la circulation des bureaux du bâtiment A1	10 j	Lun 23/08/21	Ven 03/09/21	0%
442				**3.3.1.2 CIRCULATION DU BATIMENT B R+1**	**60 j**	**Lun 09/08/21**	**Ven 29/10/21**	0%
443				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 16/08/21**	**Ven 01/10/21**	0%
444	01-DESAMIANTAGE	B R+1	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	25 j	Lun 16/08/21	Ven 17/09/21	0%
446				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**37 j**	**Lun 06/09/21**	**Mar 26/10/21**	0%
447	2- DECONSTRUCTIO	B R+1	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 06/09/21	Ven 17/09/21	0%
473				*3.3.2 CIRCULATIONS DES BATIMENTS C R+2 & G RDC*	*315 j*	*Lun 21/06/21*	*Ven 02/09/22*	0%
474				**3.3.2.1 CIRCULATION DU BATIMENT C R+2**	**285 j**	**Lun 21/06/21**	**Ven 22/07/22**	0%
476				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**280 j**	**Lun 28/06/21**	**Ven 22/07/22**	0%
477	01-DESAMIANTAGE	C R+2	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements /	33 j	Lun 28/06/21	Mer 11/08/21	0%

Jui 21 | Jul 21 | Aoû 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | Déc 21 | Jan 22 | Fév 22 | Mar 22 | Avr 22 | Mai 22 | Jui 22 | Jul 22 | Aoû 22 | Sep 22 | Oct 22 | Nov 22 | Déc 22 | Jan 23 | Fév 23 | Mar 23 | Avr 23

Tâche — Tâche critique — Référence jalon — Jalon — Jalon critique — Jalon terminé — Horaires décalées — Fractionnement critique — Planning de référence — Jalon de référence — Récapitulatif de référence — Avancement — Référence tâche — Récapitulative — Glissement — Période de fermeture université — Période d'examens université

EXTENSION ET RÉHABILITATION DU SECTEUR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PLANNING DÉTAILLÉ DES TRAVAUX TCE UBM - SRIA - FILTRÉ SUR LES TRAVAUX AVEC NUISANCES

EIFFAGE CONSTRUCTION

	Responsable	Bâtiment	Phase travaux	Tâche	Durée	Début	Fin	%
479	01- DESAMIANTAGE	C R+2	PHASE 2,3	Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 27/06/22	Ven 22/07/22	0%
480				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**265 j**	**Lun 05/07/21**	**Ven 08/07/22**	**0%**
482	02- DECONSTRUCTION	C R+2	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 05/07/21	Ven 16/07/21	0%
495				**3.3.2.2 CIRCULATION DU BATIMENT G RDC**	**35 j**	**Lun 27/06/22**	**Ven 12/08/22**	**0%**
496				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**30 j**	**Lun 27/06/22**	**Ven 05/08/22**	**0%**
497	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	G RDC	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 27/06/22	Ven 22/07/22	0%
515				***3.3.3 CIRCULATION DU BATIMENT C R+3***	***335 j***	***Lun 28/06/21***	***Ven 07/10/22***	***0%***
517				**3.3.3.1 Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**25 j**	**Lun 25/07/22**	**Ven 26/08/22**	**0%**
518	01- DESAMIANTAGE	C R+3	PHASE 2,3	Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 25/07/22	Ven 19/08/22	0%
520				**3.3.3.2 Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**40 j**	**Lun 25/07/22**	**Ven 16/09/22**	**0%**
521	2- DECONSTRUCTIO	C R+3	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 25/07/22	Ven 05/08/22	0%
546				***3.3.4 REFECTION DES CIRCULATIONS A R+2 & R+3***	***95 j***	***Lun 11/10/21***	***Ven 18/02/22***	***0%***
552				**3.3.4.1 CIRCULATION DU BATIMENT A R+2**	**55 j**	**Lun 15/11/21**	**Ven 28/01/22**	**0%**
553				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**55 j**	**Lun 15/11/21**	**Ven 28/01/22**	**0%**
554	01- DESAMIANTAGE	A R+2	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 15/11/21	Ven 10/12/21	0%
556	03- GROS OEUVRE	A R+2	PHASE 2,3	Création d'ouvertures en façade	20 j	Lun 27/12/21	Ven 21/01/22	0%
558				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**40 j**	**Lun 29/11/21**	**Ven 21/01/22**	**0%**
559	2- DECONSTRUCTIO	A R+2	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 29/11/21	Ven 10/12/21	0%
572				**3.3.4.2 CIRCULATION DU BATIMENT A R+3**	**60 j**	**Lun 15/11/21**	**Ven 04/02/22**	**0%**
573				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 22/11/21**	**Ven 07/01/22**	**0%**
574	01- DESAMIANTAGE	A R+3	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 22/11/21	Ven 17/12/21	0%
576				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**41 j**	**Lun 06/12/21**	**Lun 31/01/22**	**0%**
577	2- DECONSTRUCTIO	A R+3	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 06/12/21	Ven 17/12/21	0%
603				***3.3.5 REFECTION DES CIRCULATIONS C & D (R+1)***	***95 j***	***Lun 17/01/22***	***Ven 27/05/22***	***0%***
609				**3.3.5.1 CIRCULATION DU BATIMENT C R+1**	**42 j**	**Lun 21/02/22**	**Mar 19/04/22**	**0%**
610				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 21/02/22**	**Ven 08/04/22**	**0%**
611	01- DESAMIANTAGE	C R+1	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 21/02/22	Ven 18/03/22	0%
619				**3.3.5.2 CIRCULATION DU BATIMENT D R+1**	**60 j**	**Lun 21/02/22**	**Ven 13/05/22**	**0%**
620				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Mer 23/02/22**	**Mar 12/04/22**	**0%**
621	01- DESAMIANTAGE	D R+1	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Mer 23/02/22	Mar 22/03/22	0%
623				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**45 j**	**Mer 09/03/22**	**Mar 10/05/22**	**0%**
624	2- DECONSTRUCTIO	D R+1	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Mer 09/03/22	Mar 22/03/22	0%
650				***3.3.6 REFECTION DES CIRCULATIONS E & F (R+1)***	***140 j***	***Lun 28/02/22***	***Ven 09/09/22***	***0%***
656				**3.3.6.1 CIRCULATION DU BATIMENT E R+1**	**118 j**	**Lun 28/02/22**	**Mer 10/08/22**	**0%**
657				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 30/05/22**	**Ven 15/07/22**	**0%**
658	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	E R+1	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 30/05/22	Ven 24/06/22	0%
660				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**42 j**	**Lun 13/06/22**	**Mar 09/08/22**	**0%**
661	2- DECONSTRUCTIO	E R+1	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 13/06/22	Ven 24/06/22	0%
674				**Modification des salles E113/E115/E117 et E101**	**15 j**	**Lun 28/02/22**	**Ven 18/03/22**	**0%**
675	01- DESAMIANTAGE	E R+1	PHASE 2,3	Curage / Mise en place des confinements / Désamiantage des locaux / Mesures d'empoussièrement	15 j	Lun 28/02/22	Ven 18/03/22	0%
676				**3.3.6.2 CIRCULATION DU BATIMENT F R+1**	**55 j**	**Lun 06/06/22**	**Ven 19/08/22**	**0%**
677				**Désammiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 06/06/22**	**Ven 22/07/22**	**0%**
678	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	F R+1	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 06/06/22	Ven 01/07/22	0%
680				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**40 j**	**Lun 20/06/22**	**Ven 12/08/22**	**0%**

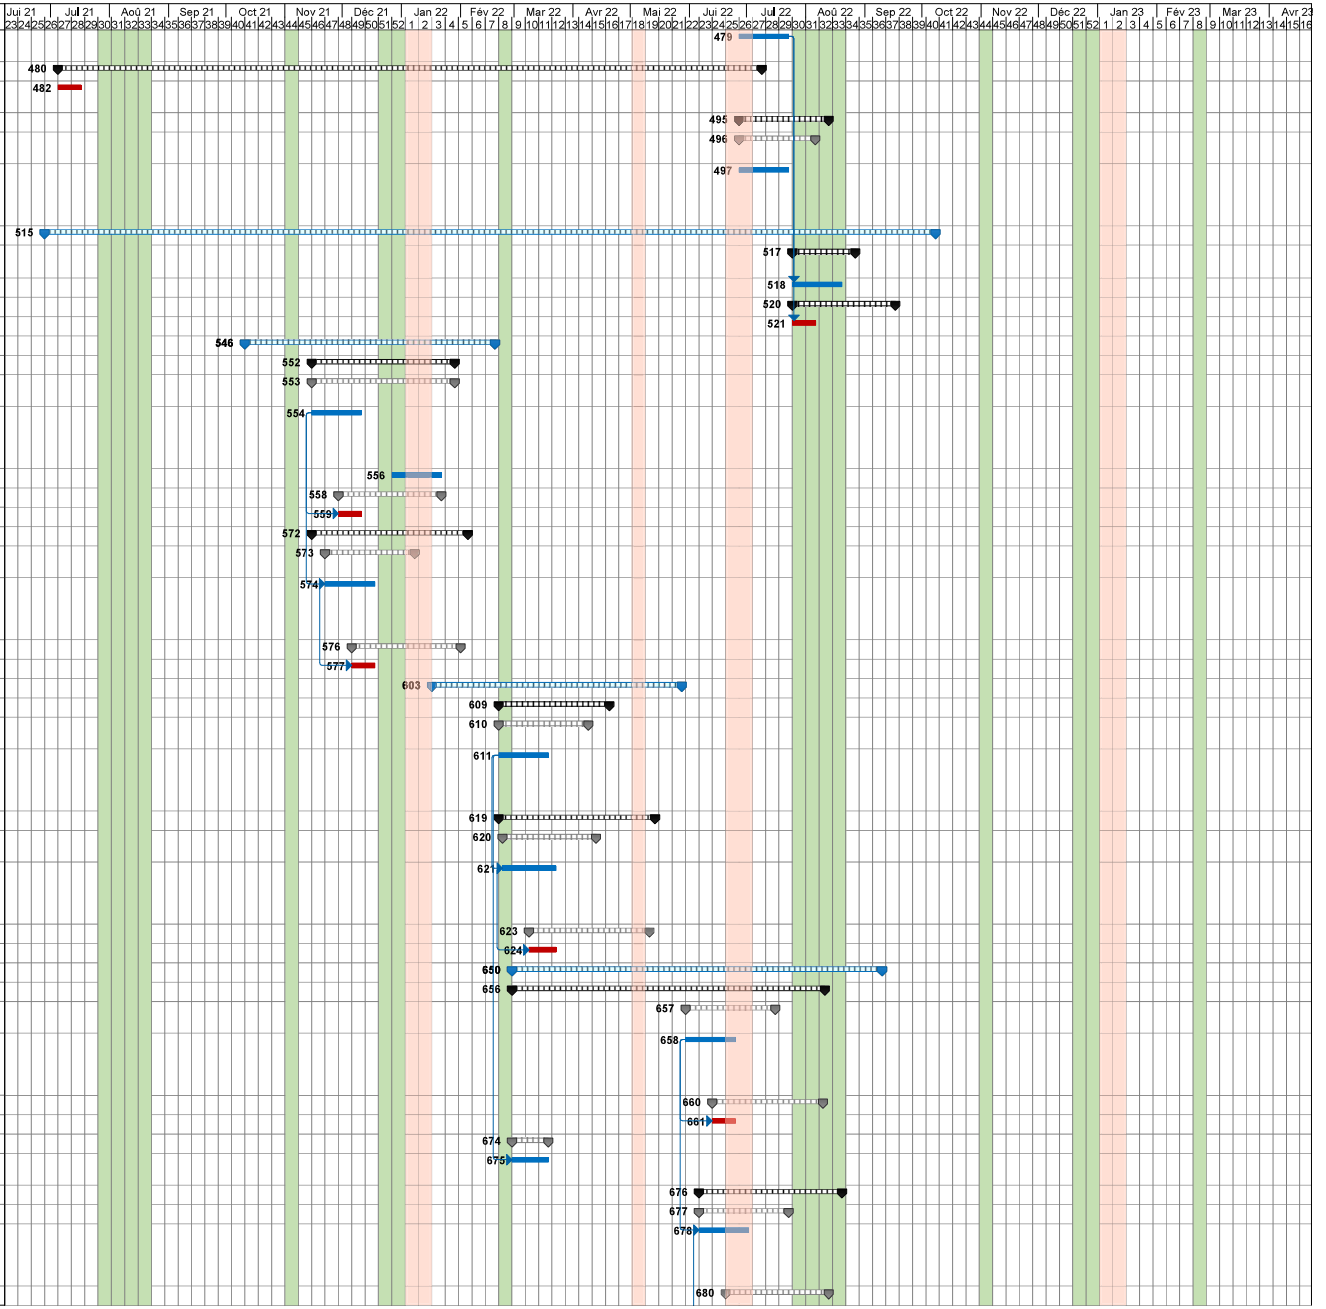

Tâche
Tâche critique
Référence jalon
Jalon
Jalon critique
Jalon terminé
Horaires décalées
Fractionnement critique
Planning de référence
Jalon de référence
Récapitulatif de référence
Avancement
Référence tâche
Récapitulative
Glissement
Période de fermeture université
Période d'examens université

EXTENSION ET RÉHABILITATION DU SECTEUR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PLANNING DÉTAILLÉ DES TRAVAUX TCE UBM - SRIA - FILTRÉ SUR LES TRAVAUX AVEC NUISANCES

EIFFAGE CONSTRUCTION

	Responsable	Bâtiment	Phase travaux	Tâche	Durée	Début	Fin	%
681	3- DECONSTRUCTIO	D R+1	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 20/06/22	Ven 01/07/22	0%
707				***3.3.7 REFECTION DES CIRCULATIONS E (R+2 / R+3)***	***95 j***	***Lun 08/08/22***	***Ven 16/12/22***	**0%**
713				**3.3.7.1 CIRCULATION DU BATIMENT E R+2**	**55 j**	**Lun 12/09/22**	**Ven 25/11/22**	**0%**
714				**Désamiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 12/09/22**	**Ven 28/10/22**	0%
715	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	E R+2	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 12/09/22	Ven 07/10/22	0%
717				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**40 j**	**Lun 26/09/22**	**Ven 18/11/22**	0%
718	3- DECONSTRUCTIO	E R+2	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 26/09/22	Ven 07/10/22	0%
731				**3.3.7.2 CIRCULATION DU BATIMENT E R+3**	**70 j**	**Lun 12/09/22**	**Ven 16/12/22**	**0%**
732				**Désamiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 19/09/22**	**Ven 04/11/22**	0%
733	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	E R+3	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 19/09/22	Ven 14/10/22	0%
735				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**40 j**	**Lun 03/10/22**	**Ven 25/11/22**	0%
736	3- DECONSTRUCTIO	E R+3	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 03/10/22	Ven 14/10/22	0%
762				***3.3.8 REFECTION DES CIRCULATIONS G (R+1 / R+3)***	***95 j***	***Lun 14/11/22***	***Ven 24/03/23***	**0%**
768				**3.3.8.1 CIRCULATION DU BATIMENT G R+1**	**45 j**	**Lun 19/12/22**	**Ven 17/02/23**	**0%**
769				**Désamiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**35 j**	**Lun 19/12/22**	**Ven 03/02/23**	0%
770	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	G R+1	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 19/12/22	Ven 13/01/23	0%
778				**3.3.8.2 CIRCULATION DU BATIMENT G R+3**	**60 j**	**Lun 12/12/22**	**Ven 03/03/23**	**0%**
779				**Désamiantage / Curage / Restructuration des locaux**	**55 j**	**Lun 19/12/22**	**Ven 03/03/23**	0%
780	14-CFO/CFA & 16 CVCP/ PBPI	G R+3	PHASE 2,3	Consignation des réseaux / Mise en place des confinements / Désamiantage circulation / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements / Dépose des menuiseries et retrait du mastic amianté	20 j	Lun 19/12/22	Ven 13/01/23	0%
782				**Mise en accessibilité PMR des sanitaires**	**40 j**	**Lun 02/01/23**	**Ven 24/02/23**	0%
783	3- DECONSTRUCTIO	G R+3	PHASE 2,3	Curage des sanitaires	10 j	Lun 02/01/23	Ven 13/01/23	0%
809				***3.3.9 RESTRUCTURATION DE L'AMPHI 700***	***305 j***	***Lun 05/07/21***	***Ven 02/09/22***	**0%**
810				**3.3.9.1 PARTIE 1 (ÉTÉ 2021) : LOTS TECHNIQUES**	**35 j**	**Lun 05/07/21**	**Ven 20/08/21**	0%
813	03- GROS OEUVRE	AMPHI 700	PHASE 2,3	Réfection CTA : Création ouverture en façade	10 j	Lun 05/07/21	Ven 16/07/21	0%
923				3.4 PHASE 2.4 : PEIGNE PARTIE 4 : RESTRUCTURATION DES BATIMENTS E / F (RDC) et G R+2	190 j	Lun 06/06/22	Ven 24/02/23	0%
924				***3.4.1 RESTRUCTURATION DES BATIMENTS E / F (RDC)***	***190 j***	***Lun 06/06/22***	***Ven 24/02/23***	**0%**
932				**3.4.1.1 CURAGE / DESAMIANTAGE DES BATIMENTS E & F**	**40 j**	**Lun 11/07/22**	**Ven 02/09/22**	**0%**
933	01- DESAMIANTAGE	E RDC	PHASE 2,4	Bâtiment E RDC : Mise en place des confinements / Consignation des réseaux / Curage / Désamiantage / Retrait du mastic amianté des menuiseries / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements	30 j	Lun 11/07/22	Ven 19/08/22	0%
934	03- GROS OEUVRE	E RDC	PHASE 2,4	Création d'ouverture, carottage, trémies	10 j	Lun 08/08/22	Ven 19/08/22	0%
935	01- DESAMIANTAGE	F RDC	PHASE 2,4	Bâtiment F RDC : Mise en place des confinements / Consignation des réseaux / Curage / Désamiantage / Retrait du mastic amianté des menuiseries / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements	30 j	Lun 25/07/22	Ven 02/09/22	0%
936	03- GROS OEUVRE	F RDC	PHASE 2,4	Création d'ouverture, carottage, trémies	10 j	Lun 22/08/22	Ven 02/09/22	0%
937				**3.4.1.2 EXTENSION EN FACADE**	**160 j**	**Lun 11/07/22**	**Ven 17/02/23**	0%
939	02- DECONSTRUCTION	E / F (RDC)	PHASE 2,4	Dépose élément préfabriqué en façade / création ouverture	15 j	Lun 01/08/22	Ven 19/08/22	0%
945	18- VRD	E / F (RDC)	PHASE 2,4	Réseaux EP extension / Création voirie pompiers / Rampe P	35 j	Lun 26/09/22	Ven 11/11/22	0%
970				***3.4.2 RESTRUCTURATION DU BATIMENT G (R+2)***	***157 j***	***Lun 11/07/22***	***Mar 14/02/23***	**0%**
973				**3.4.2.1 CURAGE / DESAMIANTAGE DU BATIMENT G R+2**	**35 j**	**Lun 18/07/22**	**Ven 02/09/22**	**0%**
974	01- DESAMIANTAGE	G R+2	PHASE 2,4	Bâtiment G R+2 : Mise en place des confinements / Consignation des réseaux / Curage / Désamiantage / Retrait du mastic amianté des menuiseries / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements	35 j	Lun 18/07/22	Ven 02/09/22	0%
975	03- GROS OEUVRE	G R+2	PHASE 2,4	Création d'ouverture, carottage, trémies	10 j	Lun 22/08/22	Ven 02/09/22	0%
987				**4. UBM PHASE 3- TRAVAUX ENTITÉ CENTRALE**	205 j	Lun 06/06/22	Ven 17/03/23	0%
1059				4.2 PHASE 3.2 RESTRUCTURATION ADMINISTRATION	105 j	Lun 05/09/22	Ven 27/01/23	0%
1068				***4.2.2 DESMIANTAGE / CURAGE DU RDC***	***25 j***	***Lun 10/10/22***	***Ven 11/11/22***	**0%**
1069	01- DESAMIANTAGE	DMINISTRATIO	PHASE 3,2	Mise en place des confinements / Consignation des réseaux / Curage / Désamiantage du RDC / Mesure d'empoussièrement et dépose des confinements	25 j	Lun 10/10/22	Ven 11/11/22	0%

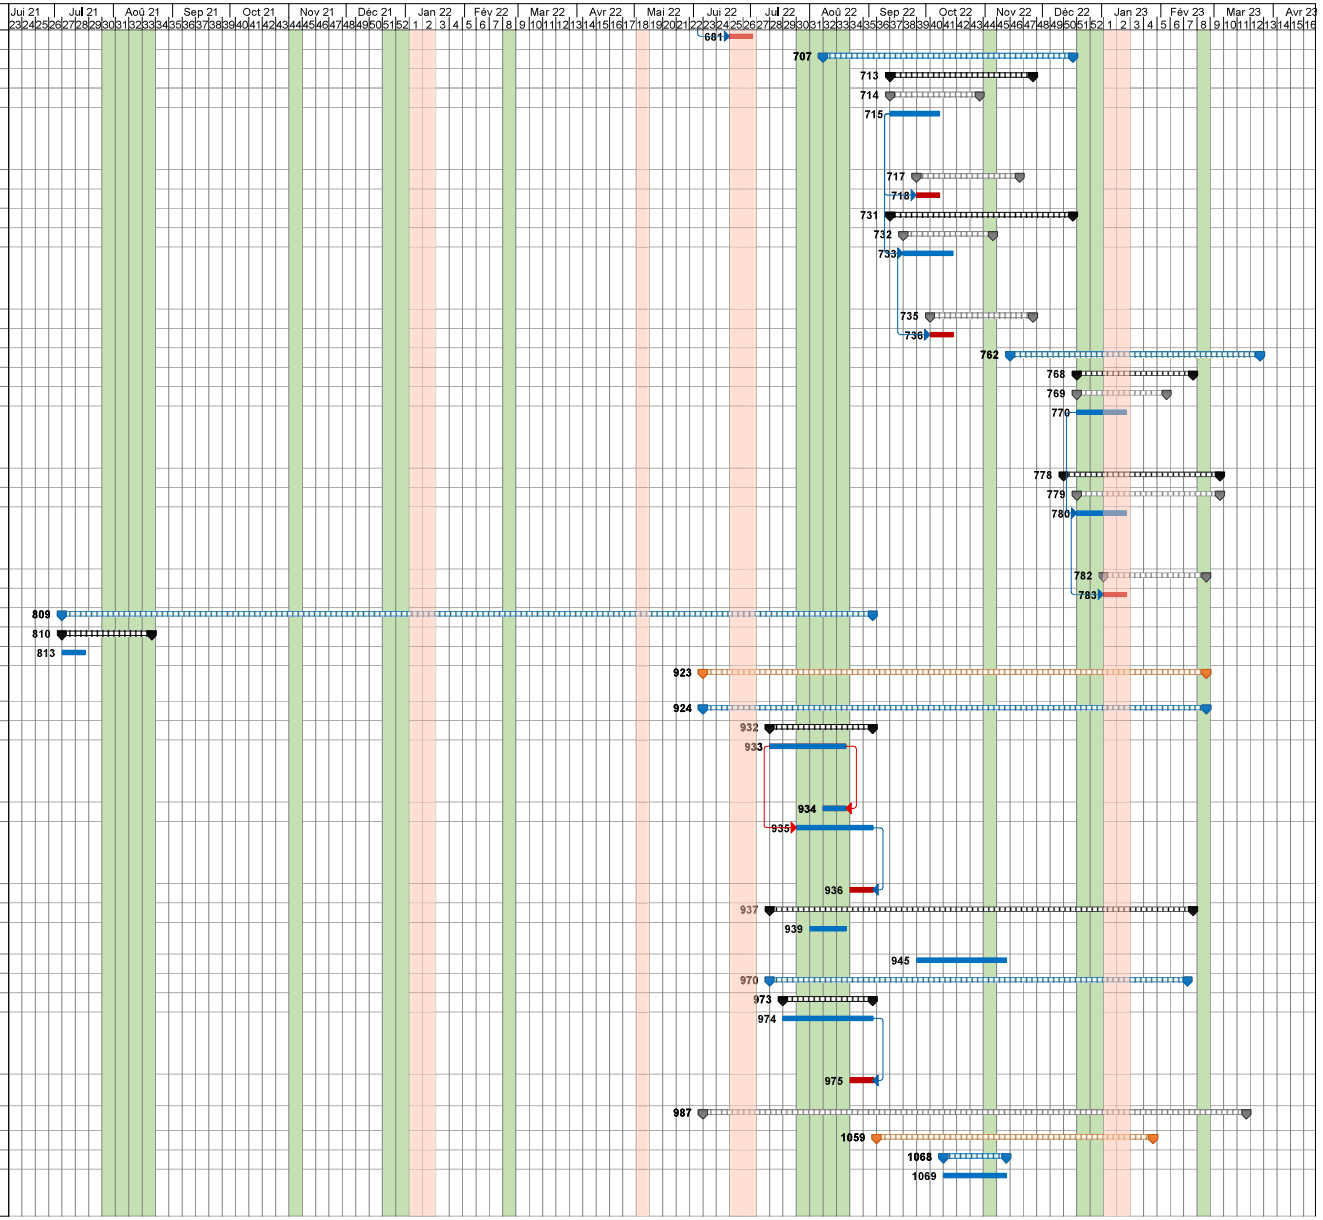

Tâche — Jalon — Horaires décalées — Jalon de référence — Référence tâche — Période de fermeture université

Tâche critique — Jalon critique — Fractionnement critique — Récapitulatif de référence — Récapitulative — Période d'examens université

Référence jalon — Jalon terminé — Planning de référence — Avancement — Glissement
